

● 現在の作業状況

旧工場棟解体工事完了後の埋め戻し・整地作業をH30年3月末に完了しました。
H30年4月中旬よりストックヤードの建設工事を開始する予定です。




● 解体工事完了後 環境調査結果

調査日 平成30年3月15・16日

環境大気

測点	ダイオキシン類	水銀	SPM	アスベスト粉じん濃度
	pg-TEQ/m ³	(μ g/m ³)	(mg/m ³)	(本/L)
① 旧工場棟北西地点	0.11	0.0058	0.019	0.06未満
② 旧工場棟北東地点	0.09	0.0056	0.023	0.06未満
③ 旧工場棟南西地点	0.24	0.0057	0.016	0.06未満
④ 旧工場棟南東地点	0.24	0.0089	0.014	0.06未満
環境基準	0.6以下	0.04以下	1日平均0.1以下	10本以下

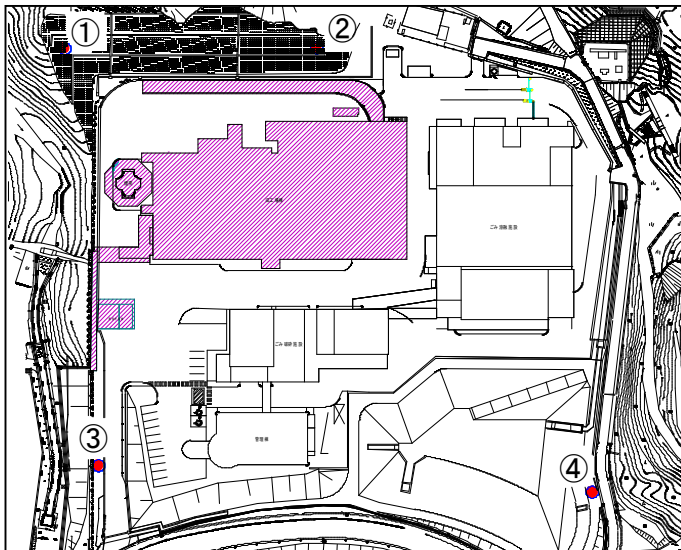

※解体工事完了後の周辺大気の状態が環境基準を満たしていることを確認しました。
